Allegati Tecnici Obbligatori

Tab 1. (Decreto 37/08, Delibera AEEG n. 40/14)

Impresa/Ditta **IMPIANTI DEMO S.R.L.** Responsabile Tecnico/Titolare **MARIO ROSSI**

Dichiarazione di conformità n° **0002-2026** Modulo "Allegato I" del: .....

Committente **Neri Anna** **Punto di Riconsegna PDR (*)** : **00880000000000**

☐ Progettista impianto gas (nomin.): ..... N° iscr.: ..... data esecuz.: .....

☐ Prog.ta camino/canna collettiva (nomin.): ..... N° iscr.: ..... data esecuz.: .....

Dichiarazioni di Conformità precedenti/parziali:

☐ Impianto gas, rif. n° ..... data ..... Impresa / Ditta .....

☐ Camino/canna fumaria, rif. n° ..... data ..... Impresa / Ditta .....

☑ impianto domestico/similare ☐ centrale termica


(per impianti con P > 350 kW è necessario allegare il parere di Conformità VVF)

Portata termica complessiva P= **31.5** **kW**

(somma delle portate termiche di tutti gli apparecchi allacciati e delle prese predisposte)

(*) obbligatorio nel caso di Committente diverso dal "Richiedente-All. H" (in alternativa indicare Comune e indirizzo dell'impianto)

DISEGNO dell'impianto realizzato. In assenza del disegno dettagliato, per descrivere l'intervento, tutti i materiali utilizzati devono essere elencati nella successiva tabella. Riferimenti a certificati o attestati ecc. sono obbligatori in caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata. **NOTA.** Identificare in modo inequivocabile ogni componente (es. numeri e lettere) e riportare nella colonna rif. Tab. 2 tale identificazione.

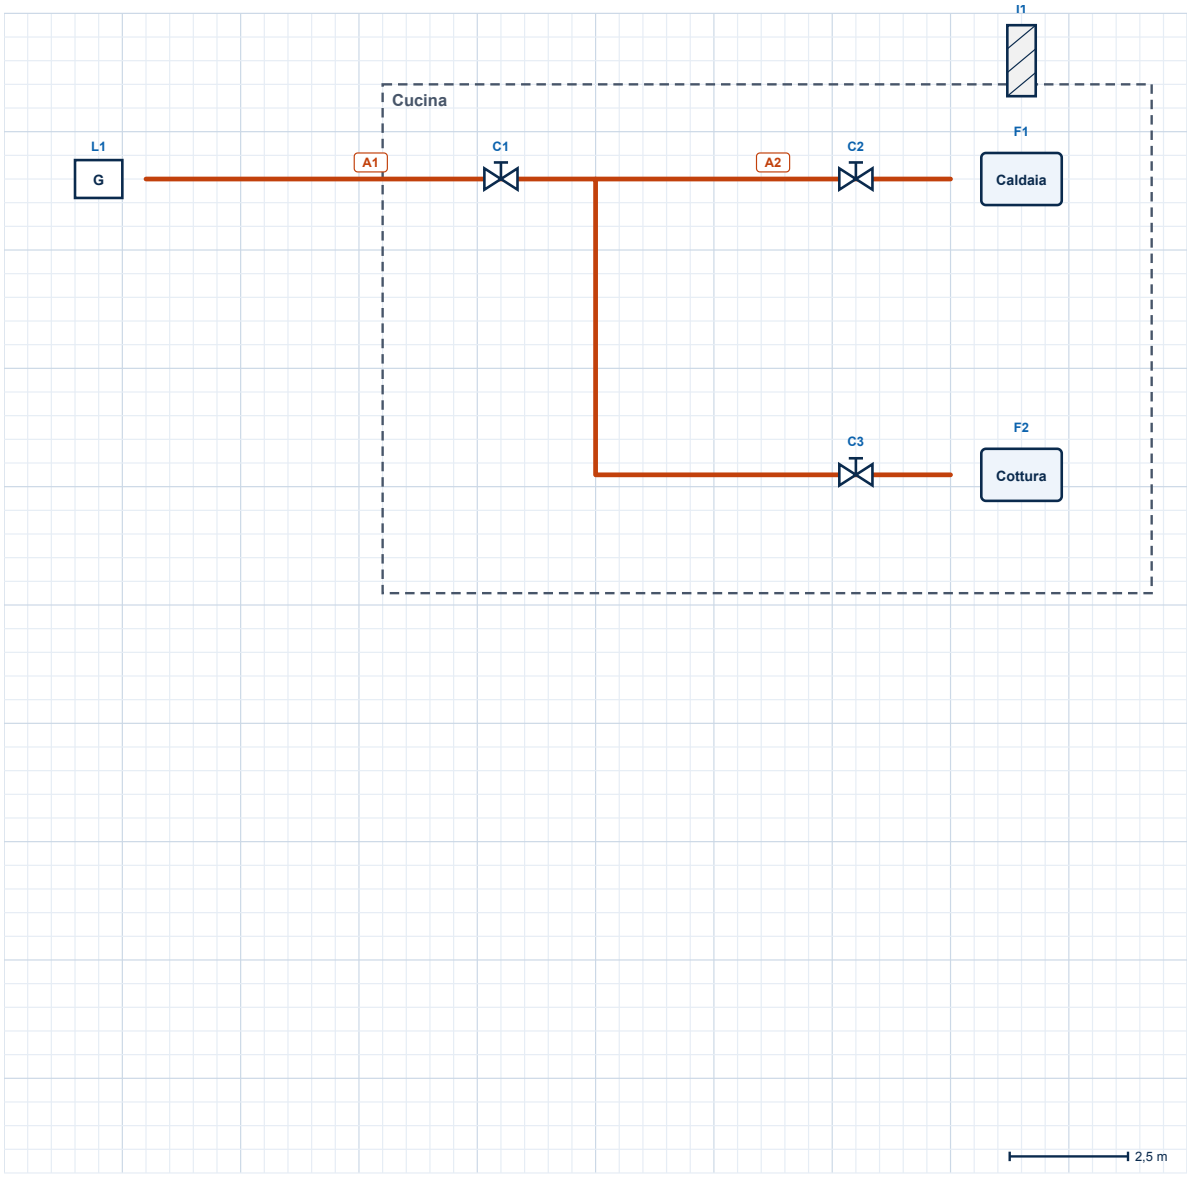

Legenda:

A= Tubo (indicare: materiale, diametro, lunghezza.
B= Raccordi (gomiti, riduzioni, nipples, manicotti, ecc.).
C= Rubinetti.
D= Tubi guaine.
E= Tubi flessibili per collegamento agli apparecchi.
F= Apparecchio a gas.
G= Apertura di ventilazione
H= Canale da fumo.
I= Camino/C.f.
L= Contatore
M= Regolatore di pressione
N= Tappo / predisposizione
O= Elettrovalvola
P= Giunto dielettrico
Q=.....
R=.....
S=.....

Tab. 2 - Descrizione dell'opera come eseguita

Dichiaro che i materiali, le tubazioni le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma/regola di installazione:

☑ UNI 7129:2015; ☐ Decreto Ministeriale 12/04/1996; ☐ Altro .....

Elenco materiali e componenti utilizzati per la realizzazione dell'impianto gas (obbligo compilazione in mancanza del disegno)

Rif.	Ubicazione (luogo/locale esatto di posa)	Componente	Materiale (prevalente)	Quantità n°	Diametro mm	Lunghezza m	Installazione	
							tipo giunzione	tipo di posa
L1	**Vano contatori al piano terra**	**Contatore gas G4 del distributore**		**1**				
A1		**Tubo**	**Rame**		**22**	**23,25**	**a pressare**	**a vista e sottotraccia**
A2		**Tubo**	**Rame**		**22**	**7,50**	**a pressare**	**sottotraccia**
C1		**Rubinetti**	**Ottone**	**1**	**3/4"**		**filettata**	**a vista**
C2		**Rubinetti**	**Ottone**	**1**	**3/4"**		**filettata**	**a vista**
C3		**Rubinetti**	**Ottone**	**1**	**3/4"**		**filettata**	**a vista**
F1	**Cucina**	**Caldaia a condensazione tipo C 24 kW**		**1**				
F2	**Cucina**	**Piano cottura 4 fuochi**		**1**				
I1	**Parete esterna cucina, sbocco a tetto**	**Camino singolo inox Dn 80**		**1**				

Note:

.....

Note:

.....

Tab. 3 - Verifica della tenuta/collaudo

Dichiaro di aver effettuato, con esito positivo, la seguente prova:

☑ tenuta/collaudo delle tubazioni gas, in conformità alla norma UNI 7129-1:2015

☐ tenuta/collaudo delle tubazioni gas, in conformità al Decreto Ministeriale 12/04/1996

☐ tenuta/collaudo delle tubazioni gas, in conformità alla Norma .....

☐ tenuta/collaudo delle tubazioni gas, alla pressione di ..... (.....) per un tempo di .....

(minuti)

Note: .....

Tab. 4 – Predisposizioni lasciate in sicurezza con tappo filettato o con rubinetto con tappo filettato:

Rif.	Ubicazione della predisposizione (esterno balcone, esterno vano tecnico, cucina, soggiorno, monolocale, ecc.)	Portata termica (kW)	Aerazione o aerabilità locale di ubicazione
			☐ aerato ☐ aerabile
			☐ aerato ☐ aerabile
			☐ aerato ☐ aerabile

Tab. 5 - Apparecchi allacciati o preesistenti:

Rif.	Ubicazione	Apparecchio	Tipo	Portata Termica (kW)	Tipo di collegamento	Allacciato / Preesistente	Ventilazione (cm²)	Aerazione (cm²)
F1		**Caldaia murale a condensazione tipo C Immergas Victrix Tera 24**		**24 kW**		**Allacciato**		
F2		**Piano cottura 4 fuochi con termocoppie (tipo A) Electrolux Piano gas 60 cm**		**7,5 kW**		**Allacciato**		
Superfici effettive totali di aerazione e ventilazione dei locali con più apparecchi installati:								

☐ **Si dichiara che i locali di installazione degli apparecchi di tipo C sono aerabili**

Apparecchi di cottura allacciati o preesistenti (specificità):

Si dichiara che i piani di cottura allacciati dalla Ditta, sono dotati di dispositivi di controllo per mancanza fiamma.

☐ **Si dichiara inoltre che anche i piani di cottura preesistenti sono dotati di dispositivi di controllo per mancanza fiamma.**

☐ Apertura di ventilazione con superficie effettiva (cm²) .....

☐ Cappa a flusso forzato o elettroventilatore con espulsione all'esterno tramite ☐ camino singolo oppure ☐ diretta all'esterno

☐ Cappa a flusso naturale con espulsione all'esterno tramite ☐ canna collettiva oppure ☐ diretto all'esterno

☐ Apertura di aerazione diretta all'esterno con superficie effettiva (cm²) ..... (posizione in alto) quota da pavimento .....

Tab. 6.1

APPARECCHIO: ..... TIPO ☐ B ☐ C [Rif.: .....]

SCARICO FUMI: ☐ Camino singolo ☐ Canna collettiva ☐ Canna collettiva ramificata ☐ Sistema intubato ☐ Diretto a parete ☐ Diretto a tetto REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO FUMI: ☐ contemporanea all'impianto ☐ preesistente

Modalità espulsione fumi:	CANALE DA FUMO				Le modalità di scarico sono compatibili con la legislazione vigente (1)
	Diametro (mm)	Lungh. I° verticale (m)	Lungh. sub-orizz. (m)	N° di curve	
☐ Tiraggio naturale					☐ sì
☐ Tiraggio forzato	☐ Rispettato le prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio (1)				☐ sì

(1) solo per apparecchi allacciati dalla Ditta che compila e firma l'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto.

Tab. 6.2

APPARECCHIO: ..... TIPO ☐ B ☐ C [Rif.: .....]

SCARICO FUMI: ☐ Camino singolo ☐ Canna collettiva ☐ Canna collettiva ramificata ☐ Sistema intubato ☐ Diretto a parete ☐ Diretto a tetto REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO FUMI: ☐ contemporanea all'impianto ☐ preesistente

Modalità espulsione fumi:	CANALE DA FUMO				Le modalità di scarico sono compatibili con la legislazione vigente (1)
	Diametro (mm)	Lungh. I° verticale (m)	Lungh. sub-orizz. (m)	N° di curve	
☐ Tiraggio naturale					☐ sì
☐ Tiraggio forzato	☐ Rispettato le prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio (1)				☐ sì

(1) solo per apparecchi allacciati dalla Ditta che compila e firma l'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto.

Tab. 6.3 APPARECCHIO: ..... TIPO ☐ B ☐ C [Rif.: .....]
SCARICO FUMI: ☐ Camino singolo ☐ Canna collettiva ☐ Canna collettiva ramificata ☐ Sistema intubato
☐ Diretto a parete ☐ Diretto a tetto REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO FUMI: ☐ contemporanea all'impianto ☐ preesistente

Modalità espulsione fumi:	CANALE DA FUMO				Le modalità di scarico sono compatibili con la legislazione vigente (1)
	Diametro (mm)	Lungh. I° verticale (m)	Lungh. sub-orizz. (m)	N° di curve	
☐ Tiraggio naturale					☐ sì
☐ Tiraggio forzato	☐ Rispettato le prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio (1)				☐ sì

(1) solo per apparecchi allacciati dalla Ditta che compila e firma l'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto.

Tab. 6.4 APPARECCHIO: ..... TIPO ☐ B ☐ C [Rif.: .....]
SCARICO FUMI: ☐ Camino singolo ☐ Canna collettiva ☐ Canna collettiva ramificata ☐ Sistema intubato
☐ Diretto a parete ☐ Diretto a tetto REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO FUMI: ☐ contemporanea all'impianto ☐ preesistente

Modalità espulsione fumi:	CANALE DA FUMO				Le modalità di scarico sono compatibili con la legislazione vigente (1)
	Diametro (mm)	Lungh. I° verticale (m)	Lungh. sub-orizz. (m)	N° di curve	
☐ Tiraggio naturale					☐ sì
☐ Tiraggio forzato	☐ Rispettato le prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio (1)				☐ sì

(1) solo per apparecchi allacciati dalla Ditta che compila e firma l'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto.

Annotazioni della Ditta che ha eseguito i lavori:

.....

Timbro

IMPIANTI DEMO S.R.L.
VIA ROMA 1 - 20121 MILANO
P.IVA 01234567890
INFO@IMPIANTIDEMO.IT

Data chiusura lavori: **07/10/2026**

Data della compilazione: **07/10/2026**

Il Responsabile tecnico/titolare: **MARIO ROSSI** firma: .....
(leggibile)

Il Committente (per presa visione): **Neri Anna** firma: .....
(leggibile)

Quest'allegato obbligatorio si compone di n° 4 fogli.
Se risultano necessarie ulteriori descrizioni, è possibile allegare più copie di questo modulo; in tal caso numerare progressivamente le pagine, in modo che sia chiara la sequenza dei moduli stessi.
Le firme possono essere apposte solo sul modulo finale.
