Allegato I (art. 7) — Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
G.U. Serie Generale n. 61 del 12/03/2008

FASCICOLO TECNICO

Dichiarazione di conformità

dell'impianto alla regola dell'arte

DICHIARAZIONE N° **0004-2026**

DATA **07-10-2026**

Copia per: Ditta - Dichiarante

IMPIANTO

COMMITTENTE: Ferrari Luca

TIPOLOGIA (D.M. 37/08): Impianti elettrici — CEI 64-8 — lettera A

INDIRIZZO: Via Manzoni 8

COMUNE: 20011 Corbetta (MI)

OPERE REALIZZATE: Fornitura e realizzazione di impianto elettrico completo per abitazione privata con potenza impegnabile fino a 4,5 kW, comprensivo di quadro elettrico generale, linee di alimentazione, circuiti dedicati per illuminazione e prese.

INTERVENTO: Nuovo impianto

RESPONSABILE TECNICO: MARIO ROSSI

COMPOSIZIONE DEL FASCICOLO

- ☑ Scheda 0 — Dichiarazione di conformità
- ☑ Scheda B — Relazione schematica impianto
- ☑ Scheda B2 — Tavole ed elaborati grafici
- ☑ Scheda D — Relazione tipologica dei materiali: materiali e componenti
- ☑ Scheda E — Verifiche
- ☑ Scheda F — Libretto d'uso e manutenzione
- ☑ Scheda G1 — Composizione fascicolo e sezione finale
- ☑ Ricevuta di consegna al committente

IMPRESA INSTALLATRICE

IMPIANTI DEMO S.R.L.

Via Roma 1 — 20121 Milano (MI)
P.IVA 01234567890 · PEC impiantidemo@pec.it
Tel. 02 0000000 · info@impiantidemo.it

Salva il contatto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Allegato I — D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

DICHIARAZIONE N°
0004-2026
DEL 07-10-2026

IMPRESA DICHIARANTE

Il/La sottoscritto/a **MARIO ROSSI** titolare o legale rappresentante dell'impresa **IMPIANTI DEMO S.R.L.**

operante nel settore **Impianti elettrici — CEI 64-8** con sede in **Via Roma 1, 20121 Milano (MI)**

Telefono **02 0000000** P.IVA **01234567890**

☑ iscritta nel Registro Imprese (D.P.R. 581/1995) della C.C.I.A.A. di **MI n. 01234567890**

☐ iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L. 443/1985) di _____

ESECUTRICE DELL'IMPIANTO (DESCRIZIONE SCHEMATICA)

Fornitura e realizzazione di impianto elettrico completo per abitazione privata con potenza impegnabile fino a 4,5 kW, comprensivo di quadro elettrico generale, linee di alimentazione, circuiti dedicati per illuminazione e prese.

inteso come: ☑ **Nuovo impianto** ☐ Trasformazione ☐ Ampliamento ☐ Manutenzione straordinaria ☐ Altro

Nota — per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: _____

per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile: **4,5 kW**

COMMISSIONATO DA / UBICAZIONE

Commissionato da **Ferrari Luca** installato nei locali siti nel Comune di **Corbetta (MI)**

via **Manzoni** n. **8** scala _____ piano _____ interno _____

di proprietà di **Ferrari Luca — Via Manzoni 8, 20011 Corbetta**

in edificio adibito ad uso: ☑ **Civile** ☐ Commerciale ☐ Industriale ☐ Pubblico ☐ Altri usi tipologia (art. 1 D.M. 37/08): ☑ **A** ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, **avendo in particolare**:

☑ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da: ☑ responsabile tecnico o titolare dell'impresa **MARIO ROSSI**

☐ progettista iscritto all'albo

☑ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego

CEI 64-8 (impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione) — CEI 64-50 (edilizia residenziale) — CEI 64-12 (impianto di terra) — CEI EN 61439-3 (quadri di distribuzione)

☑ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)

☑ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

ALLEGATI OBBLIGATORI

☐ Progetto ai sensi degli articoli 5 e 7

☑ Schema di impianto realizzato

☑ Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

☑ Relazione con tipologie dei materiali utilizzati

☑ Riferimento a dichiarazioni di conformità e/o rispondenza precedenti o parziali già esistenti

☐ Attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi: _____

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il Dichiarante — MARIO ROSSI

Il Responsabile Tecnico — MARIO ROSSI

Data **07-10-2026**

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE O DEL PROPRIETARIO, ART. 8

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Il committente **Ferrari Luca**

firma per ricevuta

SCHEDA B — RELAZIONE SCHEMATICA IMPIANTO

Impianti elettrici — CEI 64-8

DICHIARAZIONE N°
0004-2026
DEL 07-10-2026

DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE

- ☑ **Nuovo impianto**
- ☐ Modifica impianto esistente
- ☑ **Installazione/allacciamento di apparecchi**
- ☑ **Ampliamento di linea esistente**
- ☑ **Installazione di quadri elettrici**
- ☑ **Modifica dell'impianto di terra**
- ☑ **Tubazioni sotto traccia**
- ☐ Tubazioni in vista
- ☐ Canali metallici
- ☐ Canali in materiale plastico
- ☑ **Collegamenti equipotenziali principali (EQP)**
- ☑ **Collegamenti equipotenziali supplementari (EQS)**
- ☐ Adeguamento alla norma/regola tecnica

CLASSIFICAZIONE DELL'IMPIANTO (CEI 64-8)

- ☑ **Unità immobiliare a uso residenziale — livello 1 (base)**
- ☐ Unità immobiliare a uso residenziale — livello 2 (standard)
- ☐ Unità immobiliare a uso residenziale — livello 3 (domotico)
- ☐ Locale a uso commerciale/uffici
- ☐ Ambiente a maggior rischio in caso di incendio
- ☑ **Locale contenente bagno o doccia**
- ☐ Luogo con pericolo di esplosione (ATEX)

PROTEZIONI INSTALLATE

- ☑ **Interruttori automatici magnetotermici**
- ☐ Fusibili
- ☑ **Interruttori differenziali**
- ☑ **Scaricatori di sovratensione (SPD)**
- ☐ Sezionatore generale
- ☑ **Protezione contro i contatti indiretti**
- ☑ **Protezione contro i contatti diretti**
- ☐ Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (LPS)

DATI ELETTRICI DELL'IMPIANTO

TENSIONE NOMINALE (V): 230	POTENZA MASSIMA IMPEGNABILE (KW): 4,5
CORRENTE DI CORTOCIRCUITO PRESUNTA (KA): 6	SISTEMA DI DISTRIBUZIONE (TT, TN-S, IT): TT
SENSIBILITÀ DIFFERENZIALE (MA): 30	RESISTENZA DI TERRA MISURATA (Ω): 45
SEZIONE CONDUTTORE DI TERRA (MM²): 16	

IMPIANTO DI TERRA

- ☑ **Dispersore a picchetti**
- ☐ Dispersore con corda in rame interrata
- ☐ Ferri di fondazione (dispersore di fatto)
- ☑ **Collettore/nodo principale di terra accessibile**
- ☑ **Tubature metalliche collegate all'EQP**
- ☑ **Colorazioni dei conduttori rispettate (giallo-verde, blu)**

DISPERSORE DI TERRA

- ☑ **Di nuova realizzazione**
- ☐ Esistente
- ☐ Esistente con modifica sostanziale

DISPERSORE, TUBAZIONI E PRESTAZIONI (CEI 64-8)

DISPERSORI (NUMERO): 2	CORDA NUDA DI RAME (M):
DISPERSORI COLLEGATI TRA LORO DA:	UBICAZIONE DEI DISPERSORI:
DIAMETRO TUBAZIONI/CANALI (MM): 50	TASSO DI TERZA ARMONICA:
NOTE (CEI 64-8):	COLLAUDO: NOTE SULLA PROVA DI FUNZIONAMENTO:


ANALISI DEL RISCHIO PER LE SCARICHE ATMOSFERICHE

- ☑ **Edificio autoprotetto**
- ☑ **Installato SPD**
- ☐ Installato LPS

NORME DI RIFERIMENTO DEL SETTORE

CEI 64-8 · CEI 0-21 · CEI EN 61439

SCHEMA UNIFILARE

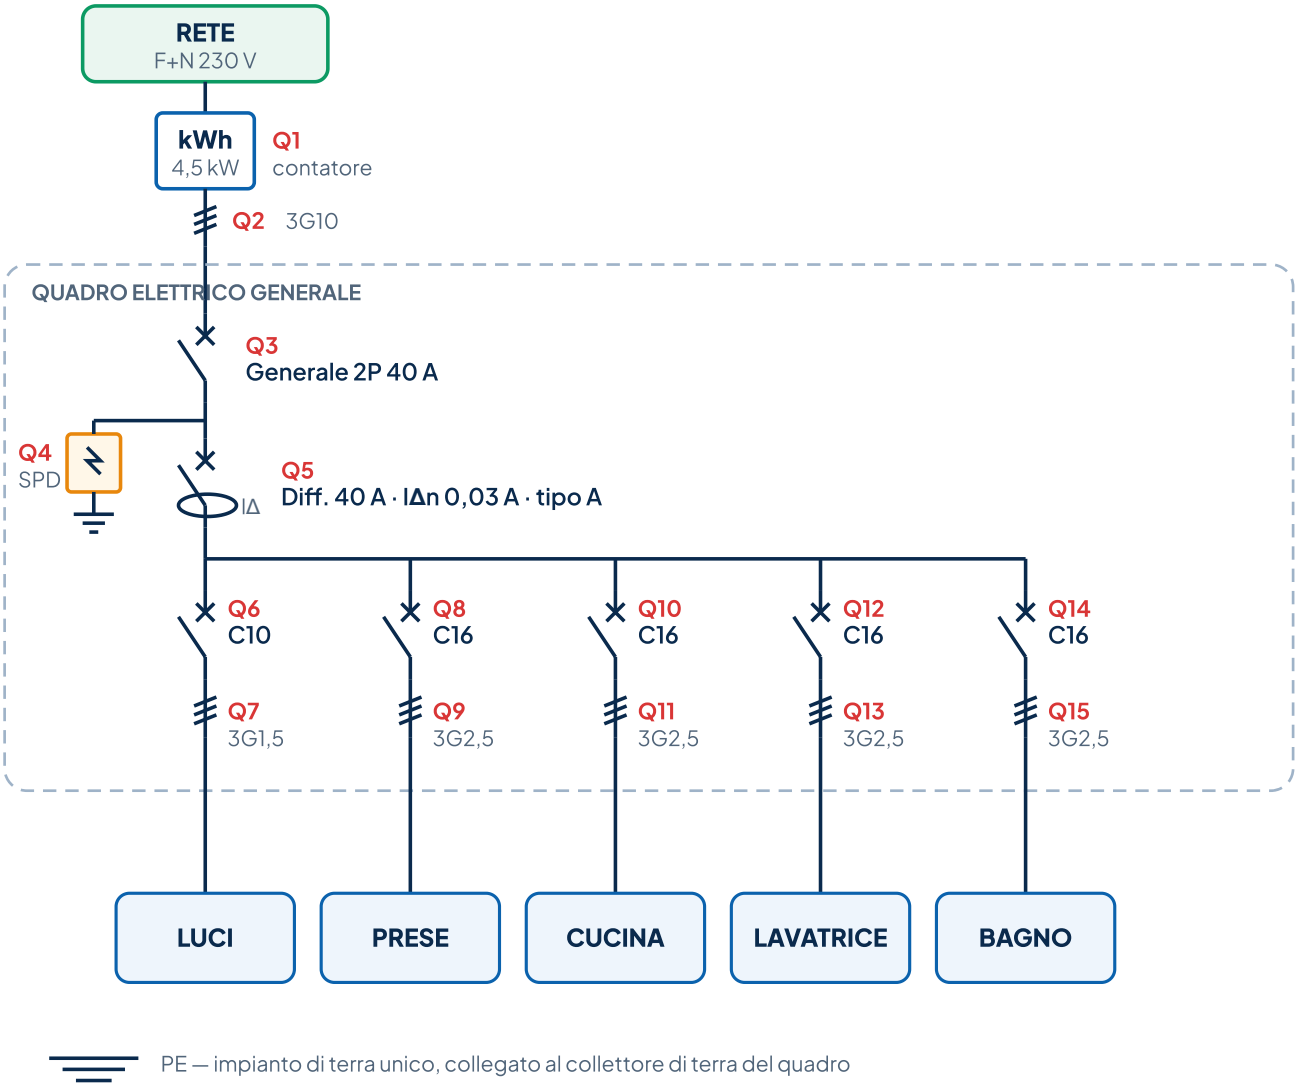

PE — impianto di terra unico, collegato al collettore di terra del quadro

SCHEDA B2 — DISTINTA COMPONENTI DELLO SCHEMA UNIFILARE

I componenti sono conformi agli artt. 5 e 6 del D.M. 37/08 e adatti all'ambiente di installazione. I riferimenti Q corrispondono a quelli dello schema.

RIF.	COMPONENTE	UBICAZIONE	INFO 1	INFO 2	INFO 3
Q1	Contatore	Punto di consegna	4,5 kW	230 V	
Q2	Cavo linea contatore → quadro	Montante	3G10	FG17	
Q3	Int. aut. magnetotermico generale	Quadro generale	2P	40 A	6 kA
Q4	Scaricatore di sovratensione (SPD)	Quadro generale	Tipo 2	Uc 275 V	In 20 kA
Q5	Int. differenziale	Quadro generale	2P 40 A	IΔn 0,03 A	Tipo A
Q6	Int. aut. magnetotermico — Luci	Quadro generale	1P+N	C10	4,5 kA
Q7	Cavo Luci	Linea Luci	3G1,5	FS17	
Q8	Int. aut. magnetotermico — Prese	Quadro generale	1P+N	C16	4,5 kA
Q9	Cavo Prese	Linea Prese	3G2,5	FS17	
Q10	Int. aut. magnetotermico — Cucina	Quadro generale	1P+N	C16	4,5 kA
Q11	Cavo Cucina	Linea Cucina	3G2,5	FS17	
Q12	Int. aut. magnetotermico — Lavatrice	Quadro generale	1P+N	C16	4,5 kA
Q13	Cavo Lavatrice	Linea Lavatrice	3G2,5	FS17	
Q14	Int. aut. magnetotermico — Bagno	Quadro generale	1P+N	C16	4,5 kA
Q15	Cavo Bagno	Linea Bagno	3G2,5	FS17	

SEZ. III — TIPOLOGIA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

Dichiaro che i materiali, le tubazioni, le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma di installazione e idonei al luogo di installazione.

RIF.	TIPOLOGIA COMPONENTE	LOCALE DI INSTALLAZIONE	COSTRUTTORE	MODELLO	Q.TÀ/M	SEZIONE/ Ø	MARCHI/CERTIFICATI
Z403	Cavo FS17			450V · 1,5	150 m		CE
Z404	Cavo FS17			450V · 2,5	120 m		CE
Z405	Cavo FS17			450V · 6,0	15 m		CE
Z406	Cavo FS17			450V · 4,0	20 m		CE
Z407	Cassetta				18		CE
Z408	Deviatore unipolare				4		CE
Z409	Interr. bipolare magneto termico diff.				1		CE
Z410	Interrutore Unipolare Luminoso				6		CE
Z411	Presa			230V · 16A · 2P + T	22		CE
Z412	Pulsante			230V · 10A	2		CE
Z413	Timer				1		CE
Z414	Pulsante a Relè Luminoso				1		CE
Z2	Int. Aut. MagnetoTermicoDifferenziale			230V · 16A · 0,3A	10		CE
Z3	Int. Aut. MagnetoTermicoDifferenziale			230V · 10A · 0,3A	10		CE
Z4	Int. Aut. MagnetoTermicoDifferenziale			230V · 20A · 0,3A	1		CE
Z5	Int. Aut. Differenziale			230V · 0,03A	1		CE
Z8	Condotto in tubo sottotraccia			tipo · diametro	180 m		CE
Z25	Modulo di controllo				1		CE
Z26	Pozzetto con picchetto intecollegato			20×20 · FeZn · + 50 X 5	1		CE

MATERIALI E COMPONENTI NON SOGGETTI A NORME

RIF.	TIPOLOGIA COMPONENTE	LOCALE DI INSTALLAZIONE	COSTRUTTORE	MODELLO	ATTESTATI

ESAMI A VISTA

ESAME	ESITO
☑ L'impianto realizzato è conforme alla documentazione allegata.	POSITIVO
☑ I componenti sono adeguati all'ambiente di installazione.	POSITIVO
☑ Le protezioni nei confronti dei contatti diretti e indiretti sono adeguate ai luoghi e all'utilizzo dell'impianto.	POSITIVO
☑ Gli impianti elettrici con tensione maggiore di 1000 V (c.a.) sono realizzati conformemente alla norma CEI 11-1.	NON_APPLICABIL
☑ Rispetto del limite di caduta di tensione (sezione dei conduttori, lunghezza e posa).	POSITIVO
☑ Conduttori protetti contro i sovraccarichi.	POSITIVO
☑ Conduttori protetti contro i cortocircuiti.	POSITIVO
☑ Isolamento dei conduttori.	POSITIVO
☑ Conduttori chiaramente identificabili dal colore e dalla marcatura.	POSITIVO
☑ Sezione minima dei conduttori di fase ≥ 1,5 mm² e dei circuiti di segnalazione ≥ 0,5 mm².	POSITIVO
☑ Riempimento dei tubi e dei canali tale da consentire gli interventi di manutenzione.	POSITIVO
☑ Connessioni dei conduttori (tipo e posizione).	POSITIVO
☑ Interruttori di comando unipolari posti sul conduttore di fase.	POSITIVO
☑ Interruttori chiaramente identificabili, la funzione è evidenziata da idonee targhette.	POSITIVO
☑ Forma e dimensioni dei componenti dell'impianto di terra (dispersori, conduttori di terra, di protezione, EQP).	POSITIVO
☑ Nodo e collettori di terra accessibili.	POSITIVO
☑ Conduttore equipotenziale principale e supplementare collegato a tutte le masse estranee.	POSITIVO
☑ Protezioni nei confronti dei contatti diretti e indiretti.	POSITIVO
☑ Impianto elettrico nel bagno.	POSITIVO
☑ Quota di installazione dei componenti dell'impianto.	POSITIVO
☑ Predisposizioni delle opere telefoniche rispondenti alle norme CEI.	POSITIVO
☑ Impianto integrativo di protezione contro le scariche atmosferiche rispondente alla norma CEI 81-1.	POSITIVO
☑ Impianto di antenna conforme alla norma CEI 100-7.	POSITIVO

VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI — PROVE STRUMENTALI

PROVA	VALORE	LIMITE	ESITO
☑ Resistenza di isolamento tra i conduttori attivi dei sistemi con tensione > 50 V c.a. e tra i conduttori attivi e la terra	> 500 MΩ	> 0,5 MΩ	POSITIVO
☑ Resistenza di isolamento dei circuiti SELV e PELV	—	> 0,25 MΩ	NON_APPLICABIL
☑ Prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali	< 0,5		POSITIVO
☑ Resistenza globale di terra	45 Ω		POSITIVO
☑ Prova di polarità	—		POSITIVO
☑ Prova degli interruttori differenziali (tempi e correnti di intervento)	18 s		POSITIVO

STRUMENTO DI MISURA

Strumento multifunzione CEI 64-8 (esempio) MF-2025-0442 — taratura del 20-01-2026



Il Responsabile Tecnico

firma

Il Committente (per ricevuta)

LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE — IMPIANTO ELETTRICO

D.M. 37/2008 art. 8 · da conservare insieme alla dichiarazione di conformità n° 0004-2026

DICHIARAZIONE N°
0004-2026
DEL 07-10-2026

Gentile cliente, questo libretto spiega come usare in sicurezza l'impianto elettrico che abbiamo realizzato per Ferrari Luca e quali controlli fare nel tempo. L'impianto è costruito secondo la norma CEI 64-8: resta sicuro se viene usato correttamente e controllato con regolarità. Conservi il libretto con la dichiarazione di conformità e lo consegni a chi dovesse abitare o usare l'immobile dopo di Lei.

IL SUO IMPIANTO IN BREVE

SALVAVITA	POTENZA IMPEGNATA	MESSA A TERRA
30 mA	**4,5 kW**	**45 Ω**

SCARICATORI (SPD)
installati

CHI CHIAMARE

IMPIANTI DEMO S.R.L.
Tel. **02 0000000**
info@impiantidemo.it
Responsabile tecnico: MARIO ROSSI

CONOSCA IL SUO QUADRO ELETTRICO



1 **Interruttore generale**: stacca la corrente a tutta la casa. Abbassarlo prima di qualsiasi lavoro, anche cambiare una lampadina.


2 **Salvavita (differenziale)**: stacca la corrente in un attimo se una persona tocca una parte in tensione o se c'è una dispersione. Ha il tasto di prova **T**.

3 **Interruttori dei circuiti** (magnetotermici): uno per zona (luci, prese, cucina…). Scattano se si collegano troppi apparecchi insieme o se c'è un corto circuito.

4 **Scaricatore di sovratensione (SPD)**: protegge gli apparecchi dai fulmini e dalle sovratensioni. Se l'indicatore diventa rosso va sostituito.

Il disegno è indicativo: nel suo quadro numero e nomi dei circuiti possono essere diversi. Sotto ogni interruttore trova l'etichetta del circuito.

PROVI IL SALVAVITA UNA VOLTA AL MESE

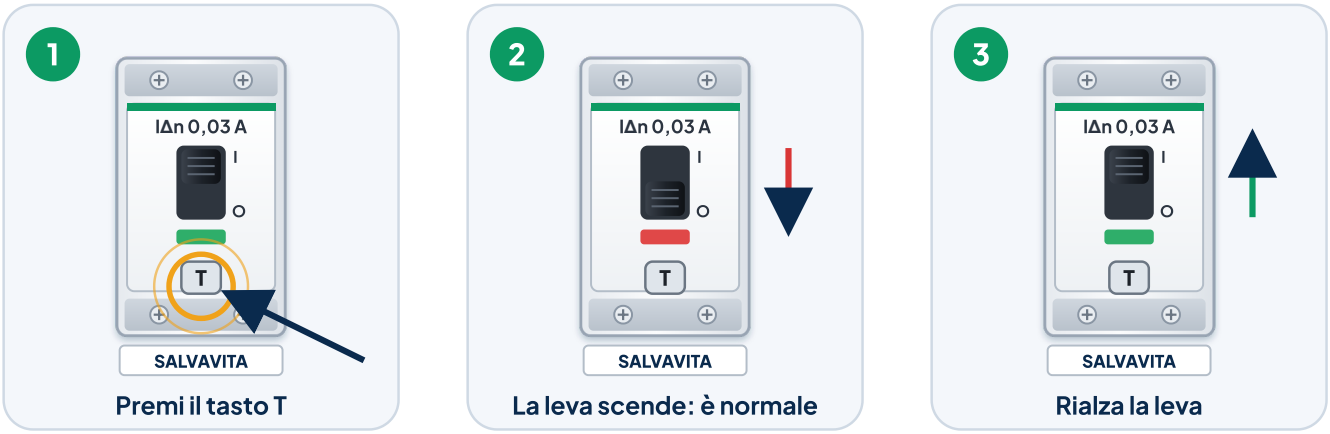

Premendo il tasto **T** il salvavita deve scattare subito. Se non scatta, l'impianto non è più protetto: chiami l'elettricista. Prima della prova salvi il lavoro sul computer e spenga gli apparecchi delicati; dopo, rimetta l'ora su forno e orologi.

SE SALTA LA CORRENTE

1 · Guardi il quadro
Cerchi la leva abbassata (verso **O-OFF**).

2 · È scattato un circuito
Troppi apparecchi insieme (forno + lavatrice + phon…). Spenga qualcosa e rialzi la leva.

3 · È scattato il salvavita
Stacchi le spine degli apparecchi della zona, rialzi la leva e ricolleghi un apparecchio alla volta: quello che la fa scattare di nuovo è guasto e non va usato.

4 · Il generale del contatore
Se è staccato anche il contatore, ha superato la potenza del contratto (4,5 kW): riduca gli apparecchi accesi e lo riarmi.

Scatta ancora o non riesce a rialzarlo?
Non insista e non forzi le leve: c'è un guasto nell'impianto o in un apparecchio. Chiami l'elettricista (**02 0000000**).

IN CASO DI EMERGENZA

- **Odore di bruciato, fumo, scintille**: abbassi subito l'interruttore generale.
- **Persona folgorata**: prima tolga la corrente dal generale, **non la tocchi** finché è in contatto; chiami il **112**.
- **Principio d'incendio** su apparecchi elettrici: **mai acqua**; usi un estintore a CO_2 o a polvere e chiami il **115**.
- **Allagamento** di locali con prese o quadri: stacchi il generale prima di entrare.

CALENDARIO DEI CONTROLLI

QUANDO	COSA	CHI
Ogni mese	Prova del salvavita con il tasto T (qui sopra).	Lei
Ogni 6 mesi	Controllo a vista di prese, spine, placche e cavi degli apparecchi; prova delle lampade di emergenza, se presenti.	Lei
Ogni 5 anni	Verifica completa dell'impianto: isolamento, continuità dei conduttori di protezione, resistenza di terra, prova strumentale dei salvavita, serraggio dei morsetti nel quadro. Ogni 2–3 anni se c'è una piscina.	Impresa abilitata (D.M. 37/08)

LIBRETTO D'USO — USO SICURO DI PRESE E APPARECCHI

Poche regole che evitano la maggior parte degli incidenti

PRESE, SPINE E PROLUNGHE

Ciabatta con interruttore e marchio: sì, ma non per stufe, lavatrici, forni o condizionatori portatili. ✓

Prese multiple una dentro l'altra o adattatori a cascata: scaldano la presa e possono causare incendi. ✗

Prolunga a bobina arrotolata: va sempre srotolata tutta prima dell'uso, altrimenti il cavo si surriscalda. ✗

Staccare la spina impugnandola, dopo aver spento l'apparecchio. Mai tirando il cavo. ✓

Apparecchi con spina con terra (spinotto centrale) o con il simbolo del doppio isolamento: non togliere mai lo spinotto di terra. ✓


Doppio isolamento: questo simbolo sull'apparecchio indica che può funzionare senza collegamento a terra. ✓

Lampade e faretti: non coprirli con panni o carta; tenere le cose infiammabili ad almeno 0,5 m dai faretti alogeni. ✗

Acqua ed elettricità: non usare apparecchi con mani bagnate o a piedi nudi; staccare il ferro da stiro prima di riempirlo. ✗

Controlli ogni tanto i cavi degli apparecchi che si muovono (ferro da stiro, aspirapolvere, phon): se l'isolamento è rovinato vicino alla spina, l'apparecchio non va usato finché non è riparato.

BAGNO E LOCALI CON VASCA O DOCCIA

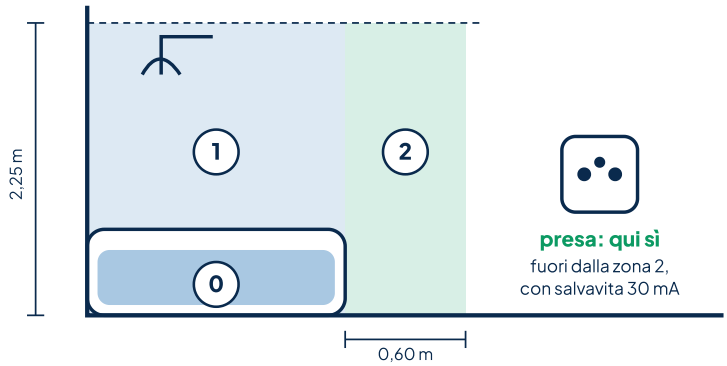

Zona 0 — dentro vasca o piatto doccia: nessun apparecchio elettrico.

Zona 1 — sopra la vasca o la doccia fino a 2,25 m: solo apparecchi fissi adatti (grado IPX4 o superiore), ad esempio lo scaldabagno.

Zona 2 — fino a 60 cm intorno: niente prese; solo apparecchi fissi IPX4 (lampade, aspiratori).

Fuori dalla zona 2 prese e apparecchi normali, protetti dal salvavita da 30 mA. Il phon e il rasoio si usano lontano da vasca e doccia.

Riferimento: norma CEI 64-8, sezione 701.

MODIFICHE E LAVORI SULL'IMPIANTO

Qualsiasi ampliamento, modifica o manutenzione straordinaria va affidata a un'impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008, che al termine deve rilasciare una nuova dichiarazione di conformità: la conservi insieme a questa. Lavori eseguiti da persone non abilitate e la mancanza dei controlli periodici non permettono di garantire la sicurezza dell'impianto.

REGISTRO DEGLI INTERVENTI

DATA	CONTROLLO O INTERVENTO ESEGUITO	IMPRESA / TECNICO	FIRMA

SCHEDA G1 — COMPOSIZIONE FASCICOLO E SEZIONE FINALE

DICHIARO

che il presente fascicolo tecnico relativo alla dichiarazione di conformità n° **0004-2026** del **07-10-2026** è composto dalle seguenti parti:

- ☑ **1.** Scheda 0 — Dichiarazione di conformità
- ☑ **2.** Scheda B — Relazione schematica impianto
- ☑ **3.** Scheda B2 — Tavole ed elaborati grafici
- ☑ **4.** Scheda D — Relazione tipologica dei materiali: materiali e componenti
- ☑ **5.** Scheda E — Verifiche
- ☑ **6.** Scheda F — Libretto d'uso e manutenzione
- ☑ **7.** Scheda G1 — Composizione fascicolo e sezione finale
- ☑ **8.** Ricevuta di consegna al committente

SEZIONE FINALE

IMPRESA / DITTA (RAGIONE SOCIALE)	TITOLARE IMPRESA	RESPONSABILE TECNICO
IMPIANTI DEMO S.R.L.	MARIO ROSSI	MARIO ROSSI



Firma del Responsabile Tecnico

firma

Il Committente — Ferrari Luca (per presa visione)

Copia rilasciata a: **Ditta - Dichiarante** — fascicolo composto da 9 schede.

RICEVUTA DI CONSEGNA AL COMMITTENTE

Dichiarazione di conformità, allegati obbligatori e libretto d'uso e manutenzione

DICHIARAZIONE N°
0004-2026
DEL 07-10-2026

IL COMMITTENTE

Il/La sottoscritto/a **Ferrari Luca**

committente dei lavori eseguiti presso **Via Manzoni 8, Corbetta (MI)**

dichiara di aver ricevuto dall'impresa **IMPIANTI DEMO S.R.L.**:

☑ la dichiarazione di conformità n° **0004-2026** del **07-10-2026**, redatta secondo l'Allegato I del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;
☑ gli allegati obbligatori (relazione con le tipologie dei materiali, schema dell'impianto, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali);
☑ il libretto d'uso e manutenzione dell'impianto;

e di averne preso visione.

INFORMAZIONI PER IL COMMITTENTE E IL PROPRIETARIO

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 37/2008 il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3, e a conservare la dichiarazione di conformità con i relativi allegati, da consegnare in caso di vendita o locazione dell'immobile.

Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente, avvalendosi del libretto d'uso e manutenzione consegnato (artt. 1375 e 1490 c.c.: esecuzione del contratto secondo buona fede e garanzia per i vizi).

La dichiarazione di conformità va presentata, ove richiesto, allo sportello unico per l'edilizia del Comune e al distributore di energia per l'attivazione della fornitura.

CONSEGNA

LUOGO
Corbetta

DATA DI CONSEGNA
07-10-2026



Per l'impresa — IMPIANTI DEMO S.R.L.

firma

Il Committente — Ferrari Luca (per ricevuta e presa visione)

ID **IMPIANTI DEMO**
Elettrici · Termoidraulici · Clima

Rapporto di verifica impianto elettrico

Verifiche prima della messa in servizio — Norma CEI 64-8 Parte 6 (9ª edizione), Guida CEI 64-14 — allegato facoltativo alla DiCo D.M. 37/08 (nota 9)

Protocollo: **0001-2026**

RAPPORTO DI VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO

A. DATI DELL'IMPIANTO

Committente **Ferrari Luca** — Dichiarazione di conformità n° **0004-2026**

Impianto in via **Via Manzoni** — n. **8**

Comune **Corbetta** — Prov. **MI**

POD _____

Tipo di verifica ☑ Iniziale (nuovo impianto) ☐ A seguito di trasformazione / ampliamento ☐ Periodica ☐ Altro

Destinazione ☑ Abitazione ☐ Uffici / terziario ☐ Commerciale ☐ Industriale / artigianale ☐ Locale medico ☐ Cantiere ☐ Altro

Sistema di distribuzione ☑ TT ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ IT

Tensione nominale _____

Alimentazione ☑ Monofase ☐ Trifase ☐ Trifase + neutro

Potenza impegnata / disponibile **4,5 kW**

Livello prestazionale CEI 64-8 Cap. 37 (abitazioni) ☑ Livello 1 ☐ Livello 2 ☐ Livello 3 ☐ Non applicabile

B. STRUMENTI DI MISURA

Strumenti utilizzati

Strumento	Marca e modello	Matricola	Data ultima taratura

C. ESAME A VISTA (CEI 64-8 art. 61.2)

Esame a vista

N.	Verifica	Sì	No	N.A.	Note
1	Protezione contro i contatti diretti: isolamento delle parti attive, barriere e involucri	☑	☐	☐	
2	Gradi di protezione IP adeguati alle influenze esterne del luogo	☑	☐	☐	
3	Protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione	☑	☐	☐	
4	Scelta e taratura dei dispositivi di protezione contro sovracorrenti	☑	☐	☐	
5	Dispositivi di sezionamento e di comando presenti e correttamente posizionati	☑	☐	☐	
6	Componenti scelti e installati in modo adatto alle influenze esterne	☑	☐	☐	
7	Identificazione dei conduttori di neutro (blu chiaro) e di protezione (giallo-verde)	☑	☐	☐	
8	Sezioni dei conduttori adeguate alla portata e alla caduta di tensione	☑	☐	☐	
9	Collegamenti equipotenziali principali (EQP) e supplementari (EQS) eseguiti	☑	☐	☐	
10	Connessioni dei conduttori correttamente serrate	☑	☐	☐	
11	Accessibilità dei componenti per comando, esercizio e manutenzione	☑	☐	☐	
12	Presenza di schemi, targhe, cartelli e identificazione dei circuiti	☑	☐	☐	
13	Barriere tagliafiamma e misure contro la propagazione del fuoco	☑	☐	☐	
14	Limitatori di sovratensione (SPD) installati dove richiesti	☑	☐	☐	
15	Locali bagno/doccia: zone della Sezione 701 rispettate	☑	☐	☐	
16	Comandi, prese e quadri ad altezza tra 40 e 140 cm dal pavimento dove richiesto (D.M. 236/89)	☑	☐	☐	

D. PROVE E MISURE GENERALI (CEI 64-8 art. 61.3)

Prove

N.	Verifica	Sì	No	N.A.	Valore	Note
1	Continuità dei conduttori di protezione e dei collegamenti equipotenziali (Ω)	☑	☐	☐		
2	Resistenza di isolamento dell'impianto (MΩ)	☑	☐	☐		
3	Protezione per separazione dei circuiti (SELV / PELV / separazione elettrica)	☑	☐	☐		
4	Resistenza di terra Ra (Ω) — sistemi TT	☑	☐	☐		
5	Impedenza dell'anello di guasto Zs (Ω) — sistemi TN	☑	☐	☐		
6	Corrente di cortocircuito presunta all'origine (kA)	☑	☐	☐		
7	Prova di intervento dei dispositivi differenziali	☑	☐	☐		
8	Verifica della polarità	☑	☐	☐		
9	Verifica della sequenza delle fasi	☑	☐	☐		
10	Prove di funzionamento (quadri, comandi, interblocchi)	☑	☐	☐		
11	Caduta di tensione (%)	☑	☐	☐		

E. MISURE PER CIRCUITO

Circuiti verificati

Circuito / descrizione	Protezione (tipo, curva, In A)	Icn (kA)	Sezione (mm²)	IΔn (mA)	Tipo diff. (AC/A/F/B)	Riso (MΩ)	Tens. prova (V)	Continuità PE (Ω)	Ra / Zs (Ω)	Ik presunta (A)	t a IΔn (ms)	t a 5·IΔn (ms)	Esito
Luci	C10 6 kA	6	1,5	30	A	> 500	500	0,08	45	—	16	9	
Prese	C16 6 kA	6	2,5	30	A	> 500	500	0,08	45	—	18	10	
Cucina	C16 6 kA	6	2,5	30	A	> 500	500	0,08	45	—	20	11	
Lavatrice	C16 6 kA	6	2,5	30	A	> 500	500	0,08	45	—	22	12	
Bagno	C16 6 kA	6	2,5	30	A	> 500	500	0,08	45	—	24	13	

F. ESITO

Esito complessivo della verifica ☐ Positivo ☐ Negativo

Osservazioni

Prescrizioni / interventi necessari

Tecnico che ha eseguito le verifiche

Il sottoscritto dichiara di aver eseguito l'esame a vista, le prove e le misure sopra riportate con gli strumenti indicati, secondo la Norma CEI 64-8 Parte 6.

Il tecnico che ha eseguito le verifiche

Il responsabile tecnico (timbro e firma)

IMPIANTI DEMO S.R.L.
VIA ROMA 1 - 20121 MILANO
P.IVA 01234567890
INFO@IMPIANTIDEMO.IT

Data **07/10/2026**

NOTE

Resistenza di isolamento (CEI 64-8, 9ª ed.): circuiti SELV/PELV prova a 250 V c.c., ≥ 0,5 MΩ; circuiti fino a 500 V prova a 500 V c.c., ≥ 1 MΩ; oltre 500 V prova a 1000 V c.c., ≥ 1 MΩ.

Sistemi TT: Ra × IΔn ≤ 50 V. Sistemi TN: Zs × Ia ≤ U0.

Differenziali di tipo generale (CEI EN 61008/61009): intervento entro 300 ms a IΔn ed entro 40 ms a 5·IΔn; i tipi selettivi (S) hanno tempi diversi.
